

# Stan realizacji inwestycji w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowego zaplanowanych na lata 2018-2020r.

# Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich:

Rok 2018:

- 1759 analizowanych decyzji wżizt
- 983 działki gruntowe nabyte z 23 decyzji ZRID
- 770 postępowań o zamówienie publiczne (zawarto 619 umów)
- 760 opinii do projektów organizacji ruchu
- 518 wydanych decyzji administracyjnych
- 223 uzgodnienia przejazdów ponadnormatywnych
- 40 odcinków nowych chodników
- 34 duże zadania inwestycyjne z udziałem środków z UE
- 21 dokumentacji projektowych (bez zaprojektuj i wybuduj)
- 15 odcinków przebudów, 11 odnów, 10 remontów chodników
- 10 remontów mostów, 2 rozbudowy mostów (do pełnej nośności)
- 19 uroczystości

## standardy zimowego utrzymania dróg wojewódzkich

- ❖ - III standard 152,125 km
- ❖ - IV standard 1 066,807 km
- ❖ - V standard 198,900 km
- ❖ - VI standard 245,949 km












## sieć dróg publicznych w woj. podkarpackim

drogi krajowe (GDDKiA)	885 km
<b>drogi wojewódzkie (PZDW)</b>	<b>1 647 km</b>
drogi powiatowe	6 642 km
drogi gminne	5 460 km
<hr/> razem	<hr/> 14 634 km



## Stan techniczny nawierzchni dróg wojewódzkich dane z 31. grudnia 2003r.

Stan dobry i zadawalający ~ 341 km (21 %)

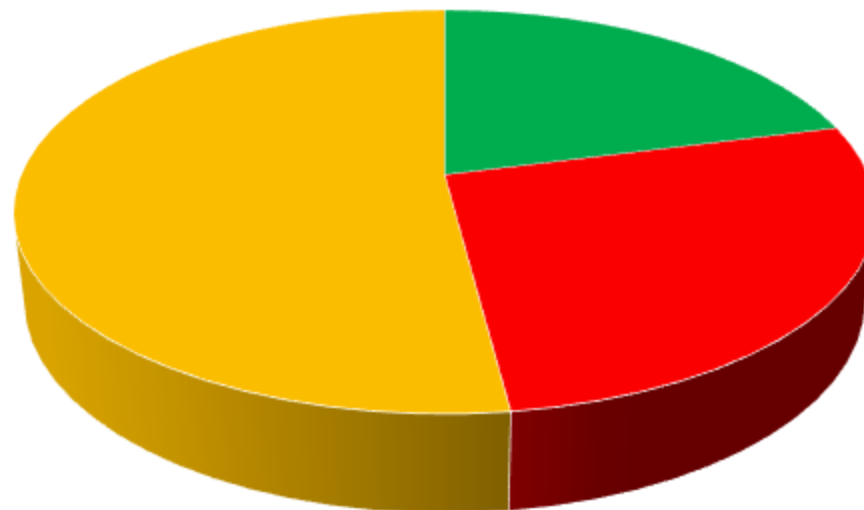


Stan zły ~ 439 km (27 %)


Stan niezadawalający ~ 846 km (52 %)



## Stan techniczny nawierzchni dróg wojewódzkich dane z 31. grudnia 2018r.

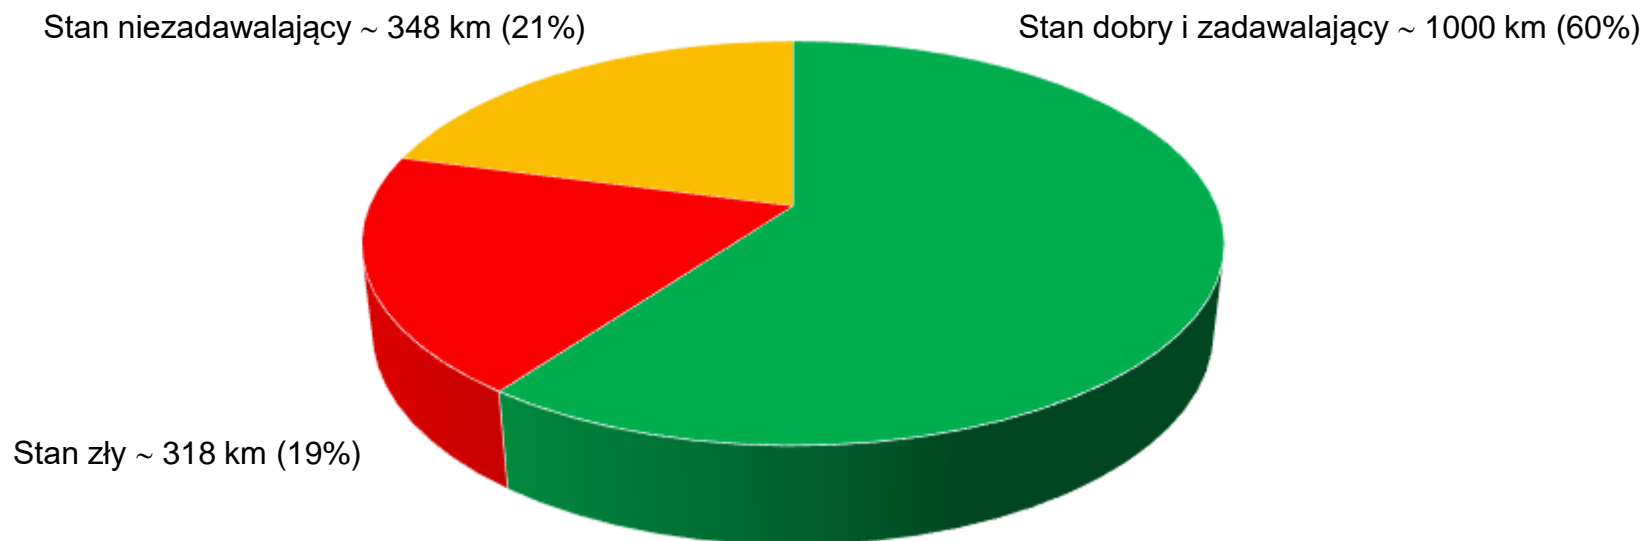


## Klasyfikacja obciążenia obiektów mostowych dane z 31. grudnia **2003r.**

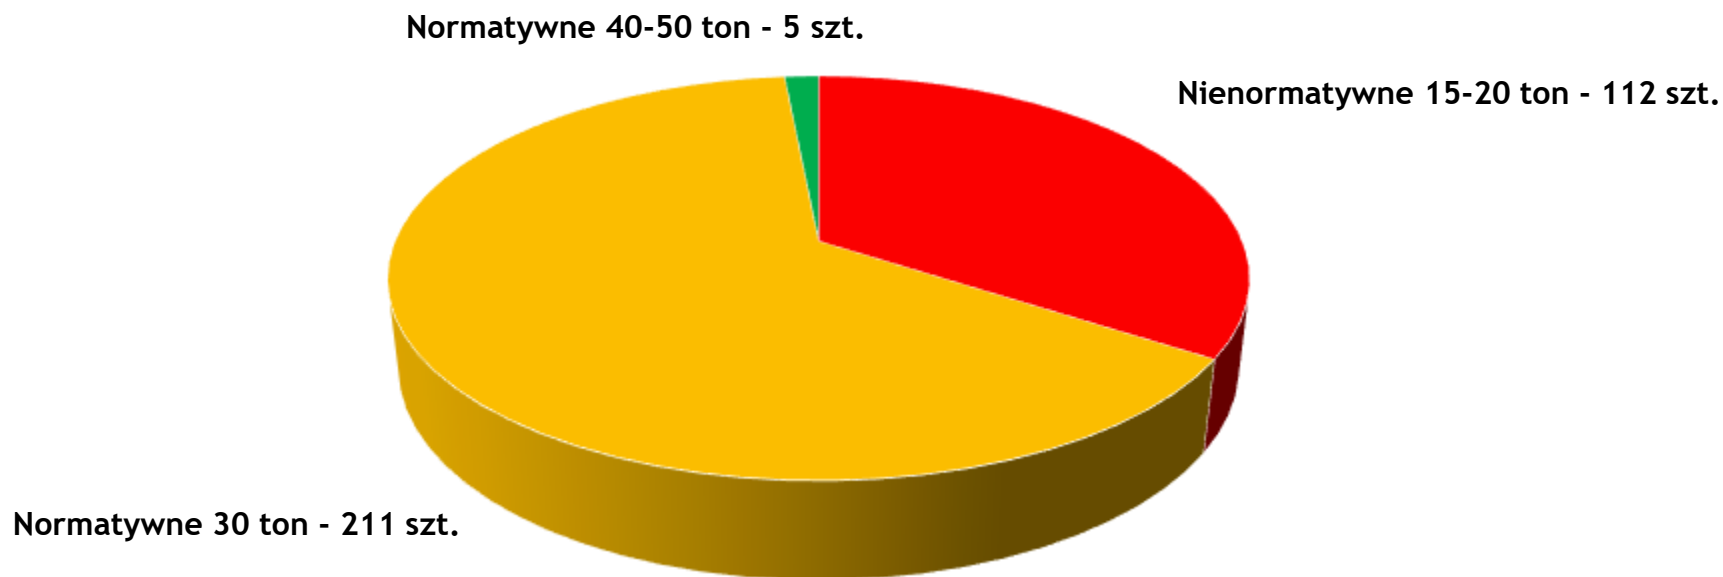

## Klasyfikacja obciążenia obiektów mostowych dane z 31. grudnia **2018r.**

Normatywne 40-50 ton - 93 szt.

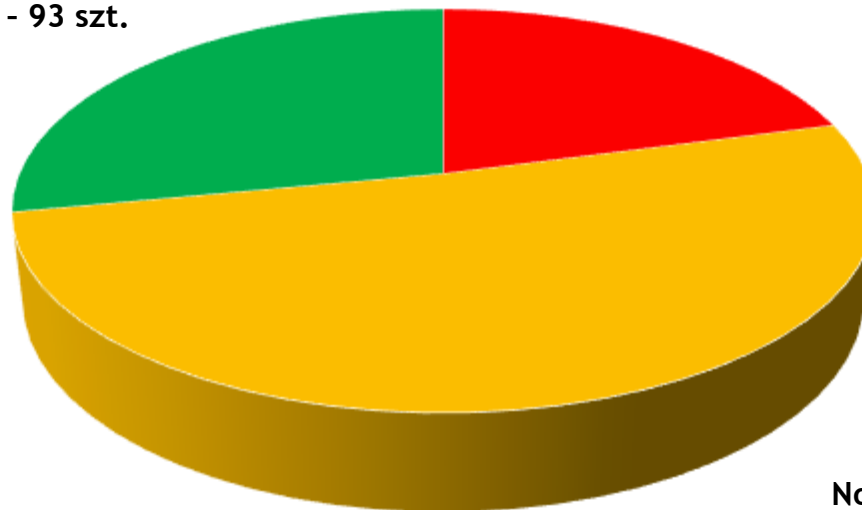

Nienormatywne 15-20 ton - 76 szt.


Normatywne 30 ton - 177 szt.



# STAN TECHNICZNY NAWIERZCHNI DRÓG NA KONIEC 2018r.



Podkarpacki Zarząd  
Dróg Wojewódzkich  
w Rzeszowie

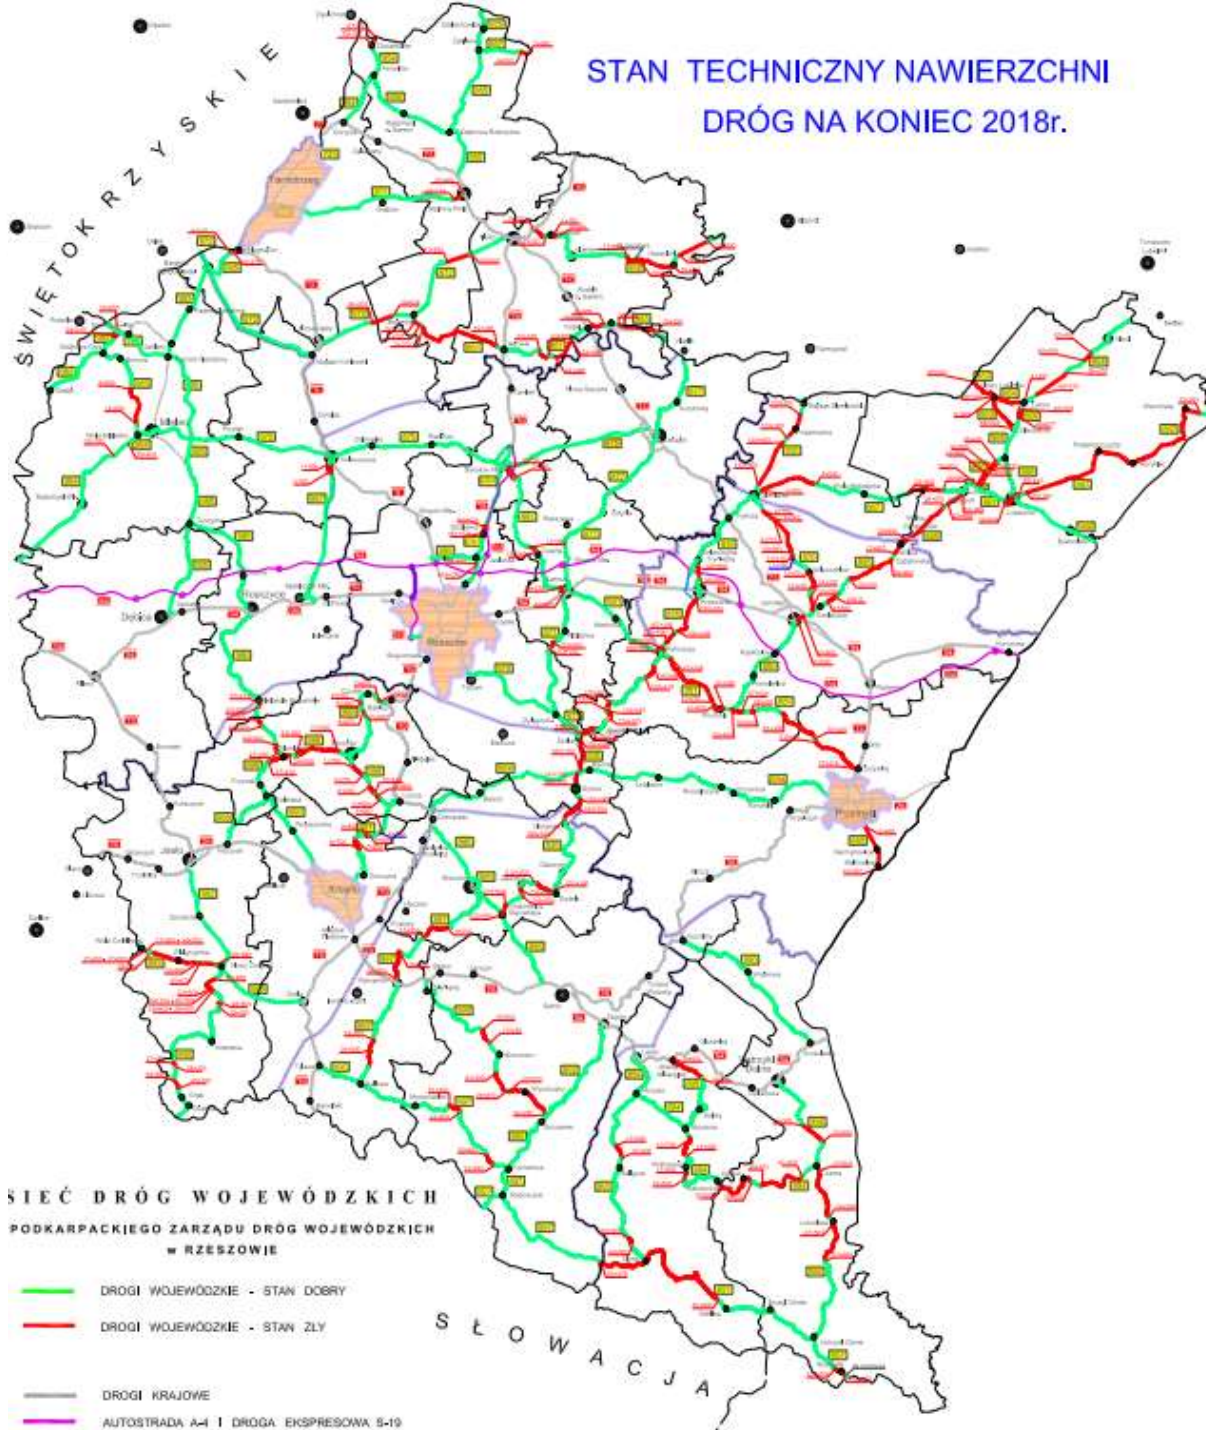

# Odnowy dróg - 2019

Lp	Nr drogi	Gmina	Miejscowość	Wartość szacunkowa zadania	Długość odcinka mb	kilometraż do REALIZACJI		STAN	Wartość	Wykonawca
						początek	koniec			
1	889	Bukowsko	Płonna	548 000,00	1 205,00	25+665,00	26+870,00	sprawdzenie przetargu	415 338,49	PDM Dębica
1a								podobne	132 661,51	
2	864	Cieszanów	Nowy Lubliniec	450 000,00	1 000,00	3+400,00	4+400,00	sprawdzenie przetargu	389 384,18	PRDM Tomaszów L.
3.	982	Czermin	Otałęż	500 000,00				przygotowywanie przedmiaru		
4.	858	Harasiuki	Harasiuki-Rogóżnia	1 083 000,00	1 800,00	26+853,00	28+653,00	sprawdzenie przetargu	851 910,71	Molter
4a								podobne	231 089,29	
5.	835	Adamówka	Adamówka - Cieplice	1 077 700,00	2 072,00	121+878,00	123+500,00	czekamy na uchwałę Zarządu		
						124+550,00	125+000,00			
6.	865	Jarosław	Koniaczów	600 000,00				sporządzanie przedmiaru, brak uchwały Zarządu		
<b>RAZEM</b>				<b>4 258 700</b>	<b>6 077</b>				<b>2 020 384,18</b>	

# Przebudowy dróg - 2019

Lp	Nr drogi	Gmina	Miejscowość	Wartość szacunkowa zadania	Długość odcinka mb	kilometraż do REALIZACJI		STAN
						początek	koniec	
1	858	Nisko	Zarzecze	1 000 000,00	1 120,00	0+024,00	1+144,00	przygotowywanie przetargu
2	986	Ostrów	Wola Ociecka	450 000,00	815,00	2+645,00	3+460,00	
3.	835	Przeworsk	Przeworsk	308 000,00	802,00	146+117,00	146+367,00	czekamy na uchwałę Zarządu
						146+496,00	146+868,00	
						148+820,00	149+000,00	
4.	987	Kolbuszowa	Kolbuszowa	950 000,00				
5.	992	Nowy Żmigród	Kąty	350 000,00				
6.	991	Korczyna	Węglówka	450 000,00				
<b>RAZEM</b>				<b>3 508 000</b>	<b>2 737</b>			



# Remonty chodników - 2019

Lp	Nr drogi	Gmina	Miejscowość	Wartość szacunkowa zadania	Długość odcinka mb	kilometraż - REALIZACJA		storna drogi	STAN	Wartość po przetargu	Wykonawca
						początek	koniec				
1	993	Nowy Żmigród	Nowy Żmigród	49 600,00	175,00	28+605,00	28+780,00	lewa	sprawdzanie przetargu	44 638,55	K. Rączka
2	866	Lubaczów	Lubaczów	120 000,00	303,00	5+411,00	5+714,00		sprawdzanie przetargu	114 391,23	Bestpol
3	982	Czermin	Otałęż	45 000,00					sporządzanie kosztorysu		
4	988	Strzyżów	Dobrzechów	400 000,00	633,00	17+494,00	17+745,00	prawa	sprawdzanie przetargu	147 925,25	EFEKT
4a						17+920,00	18+062,00				
					827,00	18+963,00	19+790,00		podobne	233 375,53	
5	884	Dynów	Bachórz	33 000,00	120,00	40+634,00	40+754,00	prawa	sprawdzanie przetargu	31 091,94	Adamek
6	985	Dębica	Brzeźnica	187 500,00	380,00	54+180,00	54+560,00	lewa	ogłoszony przetarg		
			Pustków		355,00	52+115,00	52+205,00	lewa			
						52+885,00	53+150,00				
7	872	Nisko	Nisko	140 000,00	946,00	60+254,00	61+200,00		ogłoszony przetarg		
8	991	Korczyna	Korczyna	116 000,00	595,00	16+185,00	16+780,00	lewa	czekamy na uchwałę Zarządu		
9	986	Ostrów	Wola Ociecka	121 083,49	523,00	1+716,00	2+239,00	lewa	ogłoszony przetarg		
10	988	Frysztak	Twierdza	60 000,00	513,00	31+695,00	32+208,00	prawa	ogłoszony przetarg		
<b>Razem</b>				<b>1 272 183,49</b>	<b>5 370,00</b>						

Lp.	Gmina	Nazwa zadania zgodnie z wnioskiem Gminy i na podstawie dokumentacji	Środki przeznaczone na realizację	Udział Województwa	Udział Gminy	Termin realizacji	Wartość zadania zgodnie z umową/aneeksem/fakturą	Dł. odcinka [m]	UMOWA/ANEKS GMINA - WOJEWÓDZTWO PODK.
1	2	3	4	6	5	8	10	14	16
1	KOLBUSZOWA	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Młp. polegająca na budowie chodnika w km 5+117 – 5+173 SL i 5+155 – 5+455 SP wraz z budową zatok autobusowych w km 5+226 SP i w km 5+128 SL w m. <b>Bukowiec</b>	345 000,00	170 000,00	175 000,00	31.10.	<b>456 442,96</b>	355,00	Jest
2	TRYNIECZA	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska polegająca na budowie ścieżki rowerowej w km 138+994,84 - 141+808,15 poza rowem – strona lewa odc. <b>Wólka Małkowa – Gniewczyzna Tryniecka</b> ETAP DO REALIZACJI W ROKU 2019 km 139+010 – 140+862	920 000,00	170 000,00	750 000,00	15.10.	<b>877 493,13</b>	1 852,00	Jest
3	WIĄZOWNICA	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełzec polegająca na budowie chodnika w km 14+458 - 14+637 w miejscowości <b>Ryszkowa Wola</b>	262 500,00	157 500,00	105 000,00	31.08.	<b>253 055,40</b>	179,00	Jest
4	WOJASZÓWKA	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza – Krosno polegająca na budowie chodnika w km 3+530 - 3+706 strona prawa w miejscowości <b>Przybówka</b>	200 000,00	100 000,00	100 000,00	06.08.	<b>190 363,61</b>	176,00	Jest
5	JEŻOWE	<b>Groble</b>	153 022,98	76 511,49	76 511,49				
6	RADOMYŚL NAD SANEM	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol – gr. woj. lubelskiego – Antoniów – Gorzyce polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 16+371 - 16+608,30 wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi w m. <b>Chwałowice</b>	340 000,00	170 000,00	170 000,00			237,30	Wysłana do Gminy

# Chodniki realizacja - 2019

Lp.	Gmina	Nazwa zadania zgodnie z wnioskiem Gminy i na podstawie dokumentacji	Środki przeznaczone na realizację	Udział Województwa	Udział Gminy	Termin realizacji	Wartość zadania zgodnie z umową/aneksem/fakturą	Dł. odcinka [m]	UMOWA/ANEKS GMINA - WOJEWÓDZTWO PODK.
1	2	3	4	6	5	8	10	14	16
7	BARANÓW SANDOMIERSKI	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 rz. Wiśła – Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski – Nisko polegająca na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w km 7+215 – 8+125 str. prawa w m. <b>Baranów Sandomierski i Skopanie</b>	773 000,00	273 000,00	500 000,00	15.10.	<b>772 999,99</b>	910,00	Jest
8	TYCZYN	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów - Dylągówka polegająca na budowie chodnika w km 8+048 – 8+454,5 strona lewa w m. <b>Kielnarowa</b>	570 000,00	170 000,00	400 000,00		<b>976 227,09</b>	406,50	Jest
9	DĘBOWIEC	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Gr. państwa km 5+325 – 5+538 w m. <b>Zarzeczce</b>	340 000,00	170 000,00	170 000,00	43 708,00	<b>331 647,19</b>	213,00	Jest
10	DYDNIA	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk - Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 217+800 - 218+166 strona lewa w miejscowości <b>Niebocko</b>	320 000,00	170 000,00	150 000,00	31.08.	<b>302 648,84</b>	366,00	Jest
11	ŁAŃCUT	<b>Albigowa</b>	<b>490 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>320 000,00</b>				
12	BRZOZÓW	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk - Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika w km 220+038 - 220+253 strona lewa w miejscowości <b>Grabownica Starzeńska</b>	222 434,55	170 000,00	52 434,55	30.09.	<b>187 576,23</b>	215,00	Jest



Lp.	Gmina	Nazwa zadania zgodnie z wnioskiem Gminy i na podstawie dokumentacji	Środki przeznaczone na realizację	Udział Województwa	Udział Gminy	Termin realizacji	Wartość zadania zgodnie z umową/aneeksem/fakturą	Dł. odcinka [m]	UMOWA/ANEKS GMINA - WOJEWÓDZTWO PODK.
1	2	3	4	6	5	8	10	14	16
13	CIESZANÓW	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów – Lubaczów – Krowica Hołodowska – gr. państwa, polegająca na budowie ścieżki rowerowej w km 1+512 - 1+890 str. lewa w m. <b>Dachnów</b>	320 000,00	170 000,00	150 000,00			378,00	jest
14	LUBACZÓW	<b><u>Basznia Dolna na Młodów</u></b>	500 000,00	250 000,00	250 000,00				
15	DUBIECKO	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemysł – Domaradz polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem w km 29+166 – 29+306 w m. <b>Nienadowa</b>	170 000,00	120 000,00	50 000,00	30.08.	<b>135 118,94</b>	140,00	Jest
16	RADOMYŚL WIELKI	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 26+697 – 26+938 str. lewa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. <b>Partynia</b>	240 000,00	120 000,00	120 000,00	20.09.	<b>195 151,06</b>	241,00	Jest
17	DYNÓW	<b>Dynów</b>	180 000,00	170 000,00	10 000,00				Brak
18	BUKOWSKO	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa - Bukowsko- Szczawne polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 14+915 – 15+057 str. lewa w m. <b>Nagórzany</b>	100 000,00	100 000,00	0,00	31.05.	<b>95 882,44</b>	142,00	Bez udziału Gminy
19	STRZYŻÓW	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów – Lutcza polegająca na budowie chodnika w km 2+720 – 2+890 str. prawa w m. <b>Godowa</b>	240 000,00	120 000,00	120 000,00				Jest
20	ROPCZYCE	<b>Łączki Kucharskie</b>	370 000,00	170 000,00	200 000,00				

Lp.	Gmina	Nazwa zadania zgodnie z wnioskiem Gminy i na podstawie dokumentacji	Środki przeznaczone na realizację	Udział Województwa	Udział Gminy	Termin realizacji	Wartość zadania zgodnie z umową/aneeksem/fakturą	Dł. odcinka [m]	UMOWA/ANEKS GMINA - WOJEWÓDZTWO PODK.
1	2	3	4	6	5	8	10	14	16
21	SANOK	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz-Sanok polegająca na budowie chodnika w km 26+318 - 26+530 str. lewa wraz z budową zatoki autobusowej w km 26+461,27 str. prawa w m. <b>Jurowce</b>	228 000,00	114 000,00	114 000,00			212,00	Jest
22	RAKSZAWA	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Szklary polegająca na budowie chodnika w km 31+763 – 32+110 str. prawa w m. <b>Rakszawa</b> .	370 000,00	170 000,00	200 000,00			347,00	Jest
23	<b>DĘBICA</b>	<b>Kozłów</b>	<b>410 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>240 000,00</b>				
24	SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI	Sędziszów Małopolski	220 000,00	110 000,00	110 000,00				Wyślana do Gminy
25	RYMANÓW	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa polegająca na budowie chodnika w km 15+000 – 15+175 str. prawa w m. <b>Milcza i Wróblík Szlachecki</b>	299 000,00	170 000,00	129 000,00		<b>271 754,72</b>	175,00	Jest
26	LESKO	<b>Huzele i Hoczew</b>	<b>340 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>				
27	TRZEBOWNISKO	<b>Jasionka</b>	442 470,94	130 000,00	312 470,94				W podpisie w UM
SUMA			<b>9 365 428,47</b>	<b>4 221 011,49</b>	<b>5 144 416,98</b>		<b>5 046 361,60</b>	<b>6 544,80</b>	

### Legenda:

	w trakcie przygotowywania przez WRI/WZP
	przetargi ogłoszone/rozstrzygane
	podpisane umowy z wykonawcami (bądź w trakcie podpisywania)/w trakcie realizacji
	inwestycja zrealizowana
	brak możliwości realizacji zadania
	zadanie wykreślone z realizacji

# ELEMENTY POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W § 6050

Lp.	Miejscowość	Nr drogi	zadanie	szacunkowy koszt	oferta
1.	Brzeźnica	985	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica z drogą powiatową Nr 1287R Skrzyszów – gr. powiatu Paszczyzna w miejscowości Brzeźnica”.	227 550,00	176 295,90
2.	Zarzecze	992	Zakup wraz z montażem oznakowania przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Kąty – Krempna – Świątkowa Mała – Grab – granica w km 6+595 w m. Zarzecze.	52 890,00	46 740,00
3.	Wielopole Skrzyńskie	986	Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa polegająca na rozbudowie przepustu w km 35+700 w m. Wielopole Skrzyńskie.”	200 000,00	188 958,75
4.	Brzeźnica	985	Zakup wraz z montażem aktywnego zsynchronizowanego oznakowania przejść dla pieszych w km 54+777 i 55+336 w mieście Brzeźnica	100 000,00	
5.	8 RDW		Zakup wraz z montażem stacji monitoringu na drogach wojewódzkich	95 000,00	
6.	Sadkowa Góra	982	Zakup wraz z montażem ogrodzenia wokół zbiornika	15 000,00	
<b>SUMA:</b>				<b>690 440,00</b>	<b>411 994,65</b>



# Zestawienie zadań mostowych realizowanych w 2019 roku

Lp.	Nazwa zadania	Wartość inwestycji/remontu	Wykonawca robót	Termin realizacji
<b>§ 6050</b>				
1.	Budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla w km 22+692 wraz z rozbiórką mostu istniejącego, przebudową tej drogi w km od 22+617,45 do 22+745,12 oraz budowę niezbędnej infrastruktury technicznej na działkach nr ewid. 1774, 1775, 1854 położonych w m. <u>Pielgrzymka</u> , gmina Osiek Jasielski	<b>2 538 508,90 zł</b> (w tym wartość robót: 2 462 889,65 zł, nadzór autorski: 39 483,00 zł, nadzór inwestorski: 16 136,25 zł)	Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „GODROM” Sp. z o. o. ul. Zakole 9 38-300 Gorlice	<b>31.10.2019r.</b>
2.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla polegająca na budowie mostu na potoku Kłopotnica w km 21+385 wraz z dojazdami i przebudowie oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. <u>Pielgrzymka</u>	<b>3 502 239,26 zł</b> (w tym wartość robót: 3 467 653,02 zł, nadzór autorski: 18 450,00 zł, nadzór inwestorski: 16 136,24 zł)	Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „GODROM” Sp. z o. o. ul. Zakole 9 38-300 Gorlice	<b>31.10.2019r.</b>
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów - Lutcza w km 3+730 do km 3+809 wraz z przebudową przepustu w km 3+760 w m. <u>Godowa</u>	<b>1 604 065,04 zł</b> (w tym wartość robót: 1 573 118,24 zł, nadzór autorski: 30 946,80 zł)	La Strada Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 29/208 38 – 500 Sanok	<b>30.09.2019r.</b>
<b>RAZEM</b>		<b>7 644 813,20 zł</b>		

# Zestawienie zadań mostowych realizowanych w 2019 roku

<b>§ 4270</b>				
<b>1.</b>	Zaprojektowanie i wykonanie remontu obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr <b>896</b> Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne: 1. most przez potok Smolniczek w miejscowości <b>Lutowiska</b> w km 26+378, 2. most przez potok Smolniczek w miejscowości <b>Smolnik</b> w km 26+946 3. most przez potok Smolniczek w miejscowości <b>Smolnik</b> w km 27+643	<b>1 512 900,00 zł</b>	Przedsiębiorstwo Budowlane „STALMOST” Sp. z o.o. ul. 1-go Sierpnia 12 37-450 Stalowa Wola	<b>15.10.2019r.</b>
<b>2.</b>	Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostów w ciągu drogi wojewódzkiej nr <b>893</b> Lesko – Cisna: 1. most przez potok bez nazwy w miejscowości <b>Habkowce</b> w km 34+785 2. most przez potok bez nazwy w miejscowości <b>Habkowce</b> w km 34+914 3. most przez potok Jabłonka w miejscowości <b>Jabłonki</b> w km 28+590	<b>1 476 000,00 zł</b>	Przedsiębiorstwo Budowlane „STALMOST” Sp. z o.o. ul. 1-go Sierpnia 12 37-450 Stalowa Wola	<b>22.10.2019r.</b>
<b>3.</b>	Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr <b>897</b> Tylawa – Wołosate – Granica Państwa: 1. most przez potok Izwór w miejscowości <b>Wisłok Wielki</b> w km 23+109 2. most przez potok Roztoczek w miejscowości <b>Czystogarb</b> w km 30+837	<b>1 709 700,00 zł</b>	Przedsiębiorstwo Budowlane „STALMOST” Sp. z o.o. ul. 1-go Sierpnia 12 37-450 Stalowa Wola	<b>08.11.2019r.</b>
<b>4.</b>	„Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez rzekę Świnka w miejscowości <b>Dydnia</b> w ciągu drogi wojewódzkiej Nr <b>835</b> Lublin – Dynów – Grabownica Starzeńska w km 210+297”	<b>390 000,00 zł</b> (wartość, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania)	w chwili obecnej ogłoszony jest przetarg	<b>15.11.2019r.</b>
<b>5.</b>	Remont mostu przez rzekę Tanew w miejscowości <b>Narol</b> w ciągu drogi wojewódzkiej Nr <b>865</b> Jarosław – Bełzec w km 63+342	<b>149 953,79 zł</b>	„BUDREM” Łukasz Sopol ul. Jana III Sobieskiego 75 37-600 Lubaczów	<b>30.07.2019r.</b>
<b>RAZEM</b>		<b>5 238 553,79 zł</b>		



Podkarpacki Zarząd  
Dróg Wojewódzkich  
w Rzeszowie

# Inwestycje realizowane w aktualnej perspektywie finansowej 2014-2020



- 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego**
- 2. Program Operacyjny Polska Wschodnia**
- 3. INTERREG Polska - Słowacja**
- 4. Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina**




Stan Realizacji	Liczba Zadań	Długość [km]	Wartość [mln PLN]
Zakończone	10	34,64	152,69
W trakcie robót budowlanych	12	50,81	402,02
W trakcie prac projektowych	10	77,68	323,15
W trakcie przetargu	0	0,00	0,00
W przygotowaniu	2	14,36	4,27
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>29 *</b>	<b>177,49</b>	<b>882,13</b>


\* - ilość projektów



Podkarpacki Zarząd  
Dróg Wojewódzkich  
w Rzeszowie

## Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

-  zadanie zakończone
-  zadanie w budowie
-  zadanie na etapie projektowania

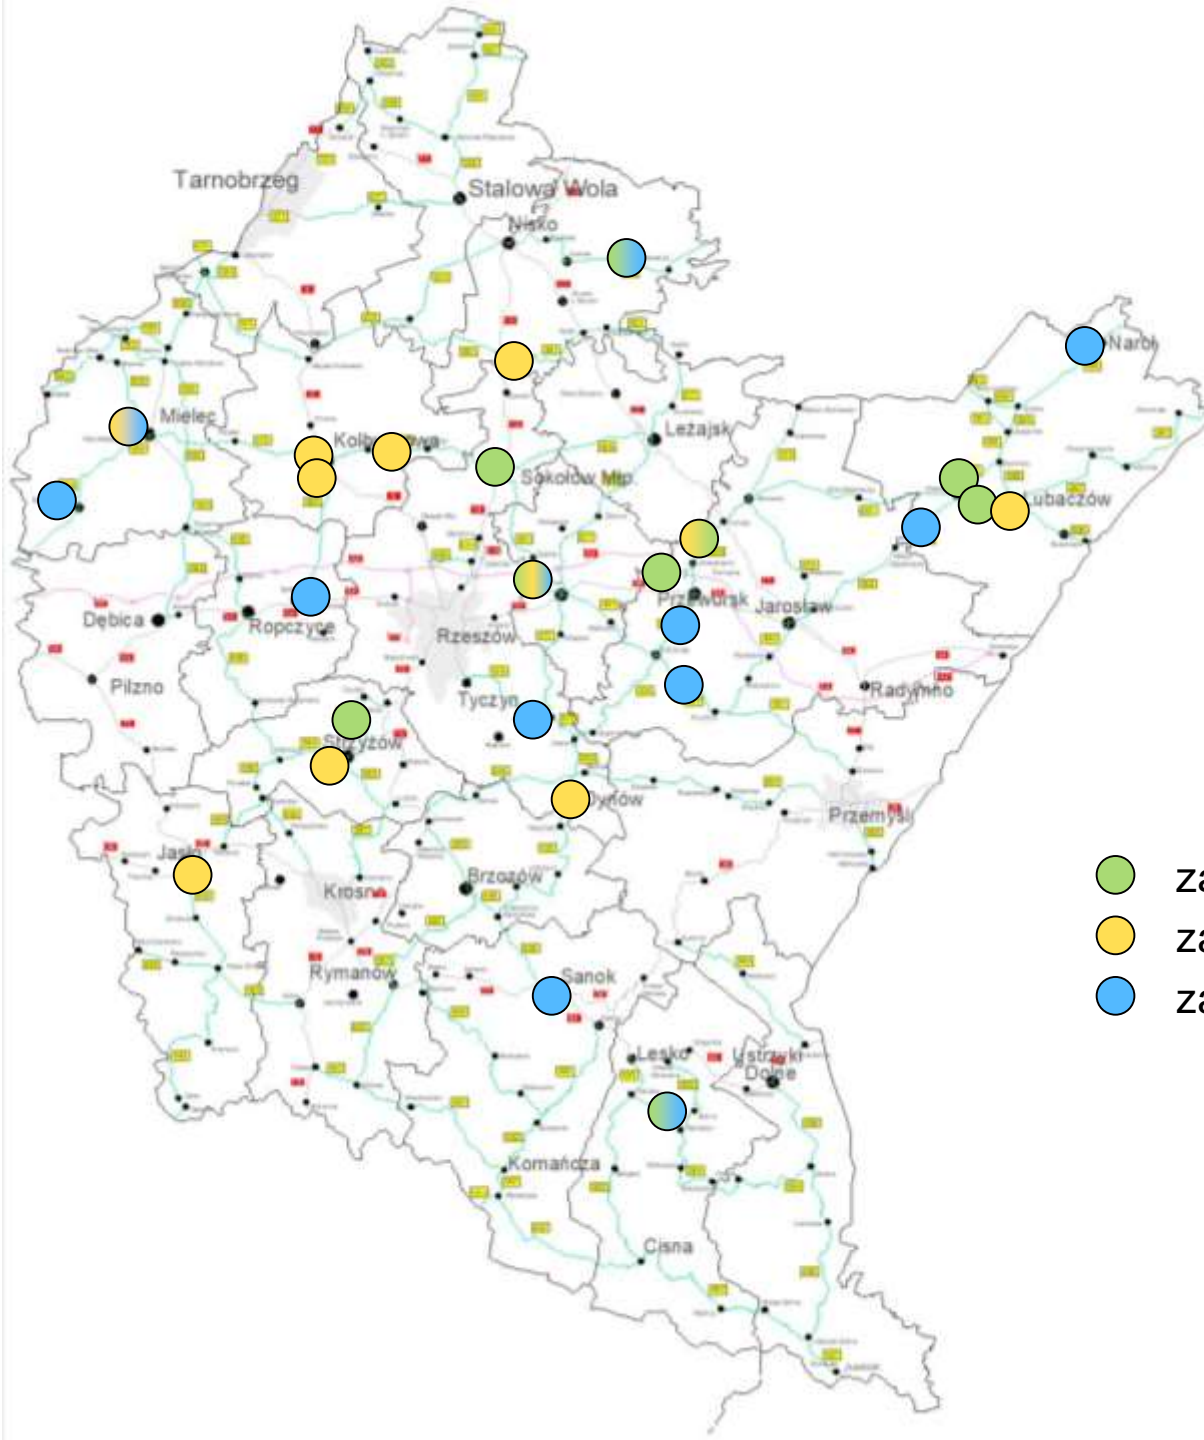

Długość odcinka (km)	Wartość projektu	Wykonawca robót budowlanych	Termin Realizacji	Wartość umowy	ZRID	Status
<b>Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Kolbuszowa - Sokołów Małopolski - Leżajsk</b>						
3,85	16 921 323	Skanska S.A.	2017	14 673 900	27.07 2015	Zakończone



## Budowa północnej obwodnicy Sokołowa Małopolskiego



Długość odcinka (km)	Wartość projektu	Wykonawca robót budowlanych	Termin Realizacji	Wartość umowy	ZRID	Status
<b>Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwizdaj)</b>						
2,1	24 558 947	MPDiM Rzeszów WOLMOST Rzeszów	06.05. 2019	21 838 688,51	26.01 2018	zakończone

**Budowa DW 835 na odcinku  
od węzła A4 "Przeworsk",  
do DK 94 (Gwizdaj)**



**Budowa DW 835 na odcinku  
od węzła A4 "Przeworsk,,  
do DK 94 (Gwizdaj)**





Długość odcinka (km)	Wartość projektu	Wykonawca robót budowlanych	Termin Realizacji	Wartość umowy	ZRID	Status
<b>Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec– Leżajsk</b>						
6,42	52 593 217	MPDiM Rzeszów PBDiM Mińsk Mazowiecki	12.06. 2019	46 788 452,57	04.06 2018	W trakcie robót budowlanych



**Budowa obwodnicy  
m. Kolbuszowa i Werynia**



Długość odcinka (km)	Wartość projektu	Wykonawca robót budowlanych	Termin Realizacji	Wartość umowy	ZRID	Status
<b>Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław–Oleszyce–Cieszanów–Bełżec</b>						
4,5	22 822 855	STRABAG	12.12.2018	17 454 488,02	17.11.2017 Cieszanów 21.11.2017 Oleszyce	Zakończone



## Budowa obwodnicy m. Oleszyce





**Budowa obwodnicy  
m. Cieszanów**





Długość odcinka (km)	Wartość projektu	Wykonawca robót budowlanych	Termin Realizacji	Wartość umowy	ZRID	Status
<b>Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica–Strzyżów–Warzyce na odcinku od m. Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów</b>						
4,06	23 126 994	STRABAG	31.10. 2018	22 503 306,95	zgłoszenie +ZRID (02.05.2018)	Zakończone



**DW 988 na odcinku  
Zaborów - Strzyżów**

Długość odcinka (km)	Wartość projektu	Wykonawca robót budowlanych	Termin Realizacji	Wartość umowy	ZRID	Status
<b>Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc</b>						
4,99	17 880 561	PBI Infrastruktura Kraśnik PBI WMB Sandomierz PRD Mielec.	30.11. 2018	16 490 076,29	Etap I - 30.10.2017 Etap II - 02.01.2018 Etap III i IV 01.02.2018 Etap V - 20.12.2017	Zakończone

**DW 867 na odcinku  
Oleszyce – Lubaczów  
wraz z budową obwodnicy Oleszyc**





Długość odcinka (km)	Wartość projektu	Wykonawca robót budowlanych	Termin Realizacji	Wartość umowy	ZRID	Status
<b>Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów – Jeżowe – Kopki na odc. od skrzyżowania DK 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze</b>						
4,05	9 767 157	PBDiM Mińsk Mazowiecki	18.08. 2018	8 886 018,36	zgłoszenie +ZRID (14.11.2018)	W trakcie robót budowlanych





**odc. od skrzyżowania DK 19 w  
m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze**

Długość odcinka (km)	Wartość projektu	Wykonawca robót budowlanych	Termin Realizacji	Wartość umowy	ZRID	Status
<b>Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec–Kolbuszowa–Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski</b>						
18,93	36 379 981	MPDiM Rzeszów WOLMOST Rzeszów	07.01. 2019 (w trakcie proc. sporu)	34 299 898,83	roboty na podstawie zgłoszenia	W trakcie robót budowlanych



**DW 875**  
**odc. Werynia - Sokołów Małopolski**



Długość odcinka (km)	Wartość projektu	Wykonawca robót budowlanych	Termin Realizacji	Wartość umowy	ZRID	Status
<b>Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul. Księżomost do DP 1334 R</b>						
1,24	8 278 213	MPDiM Rzeszów	15.08. 2019	7 196 414,53	12.02.2019	W trakcie robót budowlanych

Długość odcinka (km)	Wartość projektu	Wykonawca robót budowlanych	Termin Realizacji	Wartość umowy	ZRID	Status
<b>Przebudowa/ rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 od skrzyżowania z DW 870 w m. Sieniawa do z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna</b>						
12,64	39 174 667	<i>Przebudowa/ rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835</i>				
		PRD Mielec REMOST Dębica	31.10. 2018	24 270 116,13	04.08.2017	Zakończone
0,25	39 174 667	<i>Roboty budowlane na moście przez San w m. Ubieszyn</i>				
		REMOST Dębica	16.08. 2019	13 342 444,02	12.09.2018	W trakcie robót budowlanych



**DW 835**  
**Sieniawa - Gorliczyna**





**DW 835**  
**Sieniawa - Gorliczyna**

Długość odcinka (km)	Wartość projektu	Wykonawca robót budowlanych	Termin Realizacji	Wartość umowy	ZRID	Status
<b>Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska</b>						
4,16	37 908 120	EUROVIA	14.08.2019	29 976 437,28	17.05.2019	W trakcie robót budowlanych

Długość odcinka (km)	Wartość projektu	Wykonawca robót budowlanych	Termin Realizacji	Wartość umowy	ZRID	Status
<b>Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów–Lubaczów–granica państwa</b>						
3,4	35 783 137	STRABAG	15.11. 2019	30 858 400,49	22.06.2018	W trakcie robót budowlanych





**DW 866**  
**budowa obwodnicy m. Lubaczów**





Długość odcinka (km)	Wartość projektu	Wykonawca robót budowlanych	Termin Realizacji	Wartość umowy	ZRID	Status
<b>Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu DW 987 Kolbuszowa - Sędziszów Młp.</b>						
1,16	8 550 496	PRD Mielec REMOST Dębica	30.09. 2019	6 541 375	12.02.2019	W trakcie robót budowlanych

Długość odcinka (km)	Wartość projektu	Wykonawca robót budowlanych	Termin Realizacji	Wartość umowy	ZRID	Status
<b>Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka, a drogą krajową nr 28</b>						
1,4	24 512 640	MPDiM Rzeszów	31.08. 2019	21 384 800,65	III kw. 2019	W trakcie prac projektowych

Długość odcinka (km)	Wartość projektu	Wykonawca robót budowlanych	Termin Realizacji	Wartość umowy	ZRID	Status
<b>Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło - Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73</b>						
1,39	24 100 000	BUDIMEX	18.08.2019	19 727 179,88	22.02.2019	W trakcie robót budowlanych

Długość odcinka (km)	Wartość projektu	Wykonawca robót budowlanych	Termin Realizacji	Wartość umowy	ZRID	Status
<b>Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka</b>						
2,81	80 862 748	Etap I - odcinek Rzędzianowice - Mielec				
		BUDIMEX	15.04. 2019	38 210 939,09	09.10.2018	W trakcie robót budowlanych
7,62	80 862 748	Etap II - odcinek Piątkowiec - Rzędzianowice				
					IV kw 2019	W trakcie prac projektowych Etap uzyskiwania DoŚU

**DW 984**  
**Rzędzianowice - Mielec**





Długość odcinka (km)	Wartość projektu	Wykonawca robót budowlanych	Termin Realizacji	Wartość umowy	ZRID	Status
<b>Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984</b>						
3,1	13 376 759	MPDiM Rzeszów	18.11. 2019	10 325 122,79	II kw. 2019	W trakcie prac projektowych, procedowanie ZRID

Długość odcinka (km)	Wartość projektu	Wykonawca robót budowlanych	Termin Realizacji	Wartość umowy	ZRID	Status
<b>Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988</b>						
6,26	113 834 224	Mostostal W-wa Mostostal Kielce	31.12. 2019	98 077 960,70	29.03.2018	W trakcie robót budowlanych

**DW 988**  
**budowa obwodnicy m. Strzyżów**



Długość odcinka (km)	Wartość projektu	Wykonawca robót budowlanych	Termin Realizacji	Wartość umowy	ZRID	Status
<b>Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga</b>						
12,5	42 000 000				III kw. 2019	W trakcie prac projektowych w systemie tradycyjnym

Długość odcinka (km)	Wartość projektu	Wykonawca robót budowlanych	Termin Realizacji	Wartość umowy	ZRID	Status
<b>Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga – Pruchnik (etap I)</b>						
7,22	38 221 150	PDM Dębica	31.10. 2021	34 270 298,24	II kw. 2020	W trakcie prac projektowych



Długość odcinka (km)	Wartość projektu	Wykonawca robót budowlanych	Termin Realizacji	Wartość umowy	ZRID	Status
<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski–Łańcut–Kańczuga–Żurawica na odcinku Czarna–Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcucie</b>						
0,92	34 100 000	<i>Ul. Kraszewskiego</i>				
		STRABAG		4 371 431,03	zgłosz.	Zakończone
0,92		<i>Budowa chodnika wraz z przebudową jezdni w m. Krzemienica</i>				
		MPDiM Rzeszów		2 565 679,42	zgłosz.	Zakończone
0,74		<i>Most na rzece Wisłok</i>				
		BANIMEX AZI-BUD	31.05. 2019	24 452 366,43	28.07. 2017	W trakcie robót budowlanych
	<i>Odcinek Czarna - Łańcut wraz z mostem przez Mikośkę</i>					
3,51					W przygotowaniu	

**DW 881**  
**budowa mostu na rzece Wisłok**



Długość odcinka (km)	Wartość projektu	Wykonawca robót budowlanych	Termin Realizacji	Wartość umowy	ZRID	Status
<b>Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk</b>						
0,15	70 271 045	Budowa ronda w Polańczyku				
		PRDiM Sanok	16.06. 2018	2 070 031,35	pozwol.	Zakończone
6,24	70 271 045	DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk				
		RBDiM Krosno PBDiM Sanok REMOST	30.10. 2020	65 240 553,00	IV kw. 2019	W trakcie prac projektowych
10,85	70 271 045	DW 895 na odcinku Solina – Myczków				
						W przygotowaniu

**DW 894**  
**budowa ronda w Polańczyku**





Długość odcinka (km)	Wartość projektu	Wykonawca robót budowlanych	Termin Realizacji	Wartość umowy	ZRID	Status
<b>Przebudowa/rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 878 odc. Tyczyn – Dylągówka, Nr 877 odc. Dylągówka – Szklary oraz Nr 835 na odc. Szklary – Dynów</b>						
28,3	42 000 000				IV kw. 2019	W trakcie prac proj. w systemie tradycyjnym



Długość odcinka (km)	Wartość projektu	Wykonawca robót budowlanych	Termin Realizacji	Wartość umowy	ZRID	Status
<b>Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław–Bełżec na odcinku od m. Zapałów do m. Oleszyce (etap I)</b>						
6,00	25 000 000	PBI Infrastruktura	31.10. 2021	22 790 469,08	II kw. 2020	W trakcie prac projektowych

Długość odcinka (km)	Wartość projektu	Wykonawca robót budowlanych	Termin Realizacji	Wartość umowy	ZRID	Status
<b>Budowa obwodnicy Narola w ciągu DW 865</b>						
2,2	15 000 000				III kw. 2019	W trakcie prac proj. w systemie tradycyjnym

Długość odcinka (km)	Wartość projektu	Wykonawca robót budowlanych	Termin Realizacji	Wartość umowy	ZRID	Status
<b>Budowa DW nr 858 Zarzecze - granica województwa na odcinku Dąbrowica - Sieraków + budowa mostu na rzece Tanew i mostu na rzece Borowina</b>						
0,51	25 110 000	<i>ETAP I - Most w Ulanowie</i>				
		Mostostal Kielce	13.12. 2018	15 692 369,70	21.11. 2017	Zakończone
3,1	25 110 000	<i>ETAP II - Most na rzece Borowina i odc. Dąbrowica – Sieraków</i>				
					IV k. 2019	W trakcie prac proj. w systemie tradycyjnym

**DW 858**  
**ETAP I - Most w Ulanowie**





# Program Operacyjny Polska Wschodnia

lp	beneficjent	Nazwa zadania	Długość [km]	koszt całkowity [mln zł]
1	WP	Budowa i rozbudowa DW 869 od węzła S-19 Jasionka do DK 9 w Rudnej Małej (Etap I,II,III)	7,8	75,6
2	WP+MRz	Budowa DW od ul. Podkarpackiej (DK 19 ) do węzła Rzeszów Południe (S-19)	3,9 (WP: 1,09)	68,7 (WP: 28,0)
3	WP	Rozbudowa DW 878 od granicy miasta Rzeszowa (most na Strugu) do ul. Orkana w Tyczynie (DP nr 1404 R)	0,83	17,3
4	WP	Rozbudowa i budowa DW 988 na odcinku Babica - Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca	4,39	85,5





## Program Operacyjny Polska Wschodnia

-  zadanie zakończone
-  zadanie w budowie



**DW 869 (Iotniskowa)  
etap I**







**DW 869 (Iotniskowa)  
etap II**





**DW 869 (lotniskowa)  
etap III**







**DW 869 (lotniskowa)  
etap III**







**DW 869 (Iotniskowa)  
etap III**



**DW 883 (Kielanówka)  
od ul. Podkarpackiej (DK 19)  
do węzła Rzeszów Południe (S-19)  
/odcinek pozamiejski/**



**DW 878 od granicy miasta  
Rzeszowa (most na Strugu)  
do ul. Orkana w Tyczynie**





**DW 988 na odcinku Babica - Zaborów  
wraz z budową obwodnicy Czudca**



# **INTERREG V-A**

## **Polska - Słowacja**

### **Program Współpracy Transgranicznej**

### **Polska – Białoruś – Ukraina**



### INTERREG V-A Polska - Słowacja

Stan Realizacji	Liczba Zadań	Długość [km]	Wartość [mln PLN]
Zakończone	1	6,85	13,8
Przygotowane do realizacji	1	2,10	18,9
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>2</b>	<b>8,95</b>	<b>32,7</b>


### Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina

Stan Realizacji	Liczba Zadań	Długość [km]	Wartość [mln PLN]
Przygotowane do realizacji	2	7,31	32,1
W trakcie prac projektowych	2	18,90	16,3
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>4</b>	<b>26,21</b>	<b>48,4</b>

**Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy miastami Snina –  
Medzilaborce – Krosno / rozbudowa DW 897:  
na odcinku Tylawa - Daliowa**

PL-SK - 1


- Umowa o dofinansowanie w partnerstwie z Krajem Preszowskim (lider)
- Umowa na roboty z 22.06.2017r.  
STRABAG Sp. z o.o.
- Wartość zadania: 13,8 mln PLN
- termin realizacji: 31.05.2018

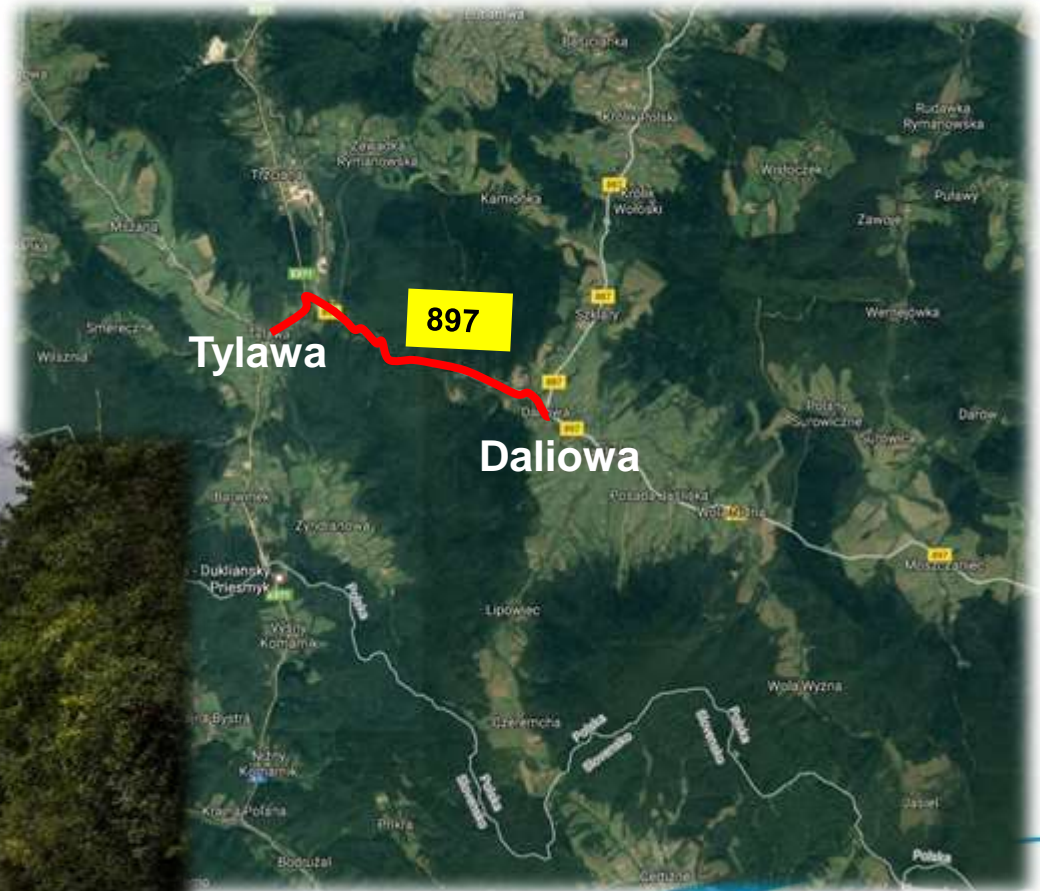

PL-SK - 2

- Umowa o dofinansowanie w partnerstwie z Krajem Preszowskim (lider WP PZDW)
- Montaż finansowy z udziałem środków Województwa Podkarpackiego Miasta Jasła Powiatu Jasielskiego

## Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło

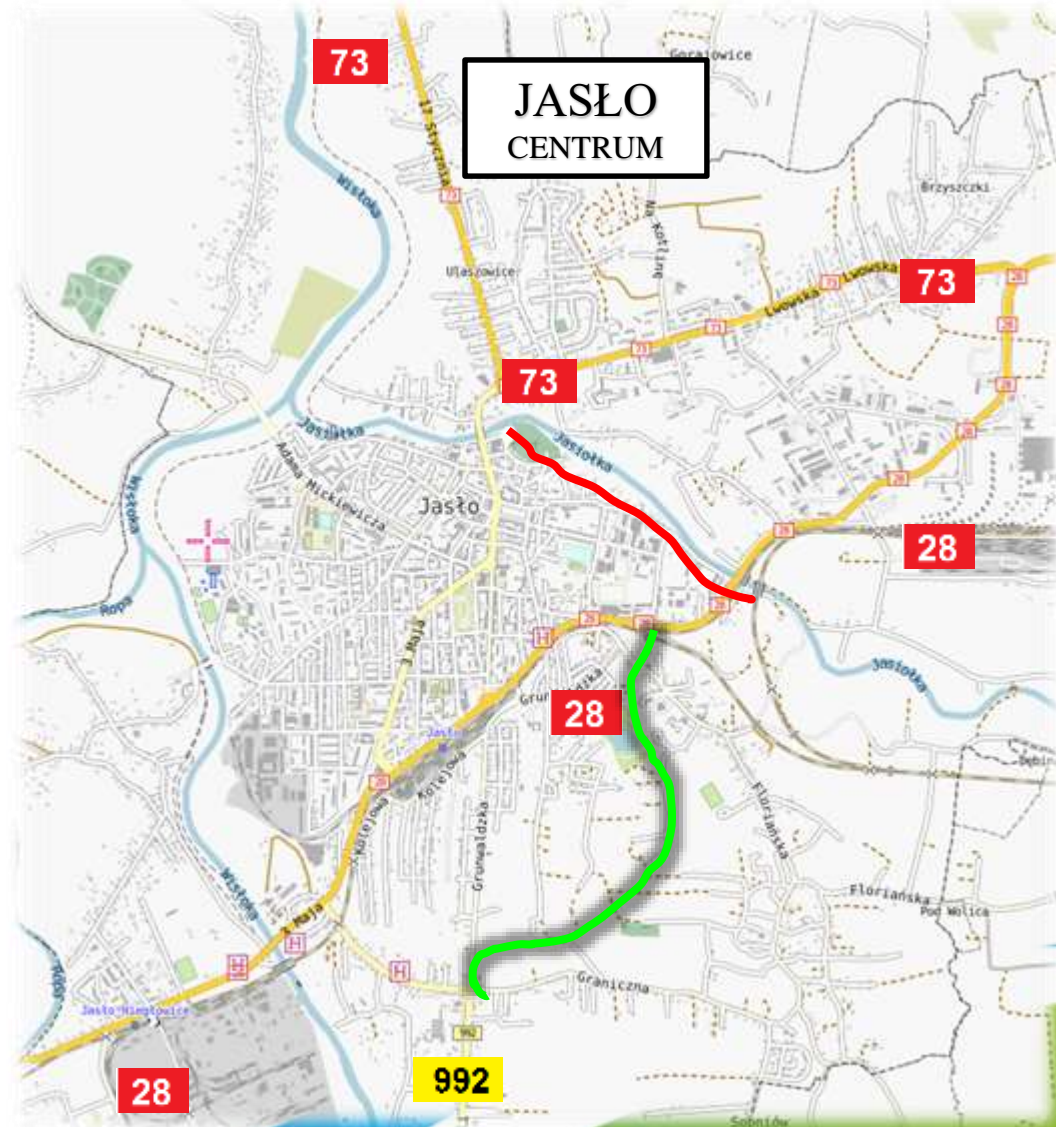



PL-BY-UA - 1

- stadium: PB – 30.04.2017, DŚ – 14.04.2017,
- ZRiD uzyskano 1.12.2017
- planowane rozpoczęcie robót: 2019r.
- planowane zakończenie robót: 2020 r.
- SDR 2015: 1 431 poj./dobę

Zakres robót :

- długość: 6,615 km
- przebudowa/rozbudowa istniejącej drogi w pasie drogowym
- obiekty inżynierskie: przebudowa i budowa 2 obiektów mostowych – dostosowanie do klasy A
- budowa nowych chodników






**„Rozbudowa DW Nr 867 Sieniawa – Oleszyce - Granica  
Województwa: odcinek Lubaczów – Basznia Górna”**

PL-BY-UA - 2

- W opracowaniu dokumentacja projektowa
- planowana decyzja ZRiD II kw. 2019 r.  
(11.10.2018 r. – złożenie wniosku  
14.01.2019 r. – wszczęcie procedury)
- planowane rozpoczęcie robót: 2019 r.
- planowane zakończenie robót: 2020/2021 r.
- SDR 2015: 1 898 poj./dobę

Zakres robót :

- długość: ok. 9,5 km
- wymiana konstrukcji nawierzchni jezdni
- wymiana przepustów drogowych
- przebudowa lub budowa systemu  
odwodnienia drogi
- budowa chodników przy zatokach autobusowych
- przebudowa obiektu mostowego w Sołonie –  
dostosowanie do klasy B
- budowa/przebudowa zatok autobusowych

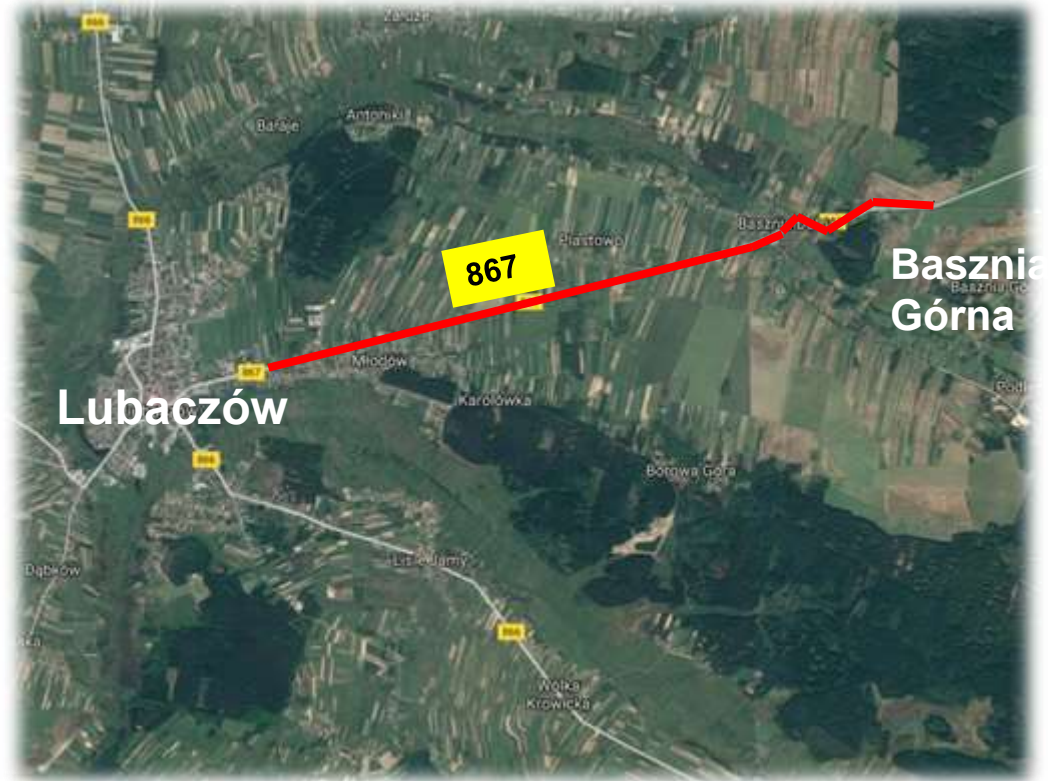

**„Rozbudowa DW Nr 867 Sieniawa – Oleszyce - Granica  
Województwa: odcinek Basznia Górna - Horyniec”**

PL-BY-UA - 3

- W opracowaniu dokumentacja projektowa
- planowane rozpoczęcie robót: 2019 r.
- planowane zakończenie robót: 2020/2021 r.
- SDR 2015: 1 898 poj./dobę

Zakres robót :

- długość: ok. 9,4 km
- wymiana konstrukcji nawierzchni jezdni
- wymiana przepustów drogowych
- przebudowa lub budowa systemu odwodnienia drogi
- budowa zatok autobusowych
- budowa/przebudowa chodników i ścieżki rowerowej



**„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Hrebenne od km 37+142 do km 37+810 ul. Wyszyńskiego w miejscowości Lubaczów” (odcinek od mostu do skrzyżowania z DW 866)”**

PL-BY-UA - 4

- W opracowaniu dokumentacja projektowa
- planowane rozpoczęcie robót: 2019 r.  
(14.08.2018 r. – zgłoszenie robót)
- planowane zakończenie robót: 2019/2020 r.
- SDR 2015: 1 898 poj./dobę

Zakres robót :

- długość: ok. 0,7 km
- wymiana konstrukcji nawierzchni jezdni
- przebudowa elementów systemu odwodnienia drogi
- wykonanie oznakowania poziomego






**Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865  
Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec  
wraz z budową mostu na rzece San**



**wybrany  
wariant  
trasy**



# Zestawienie inwestycji

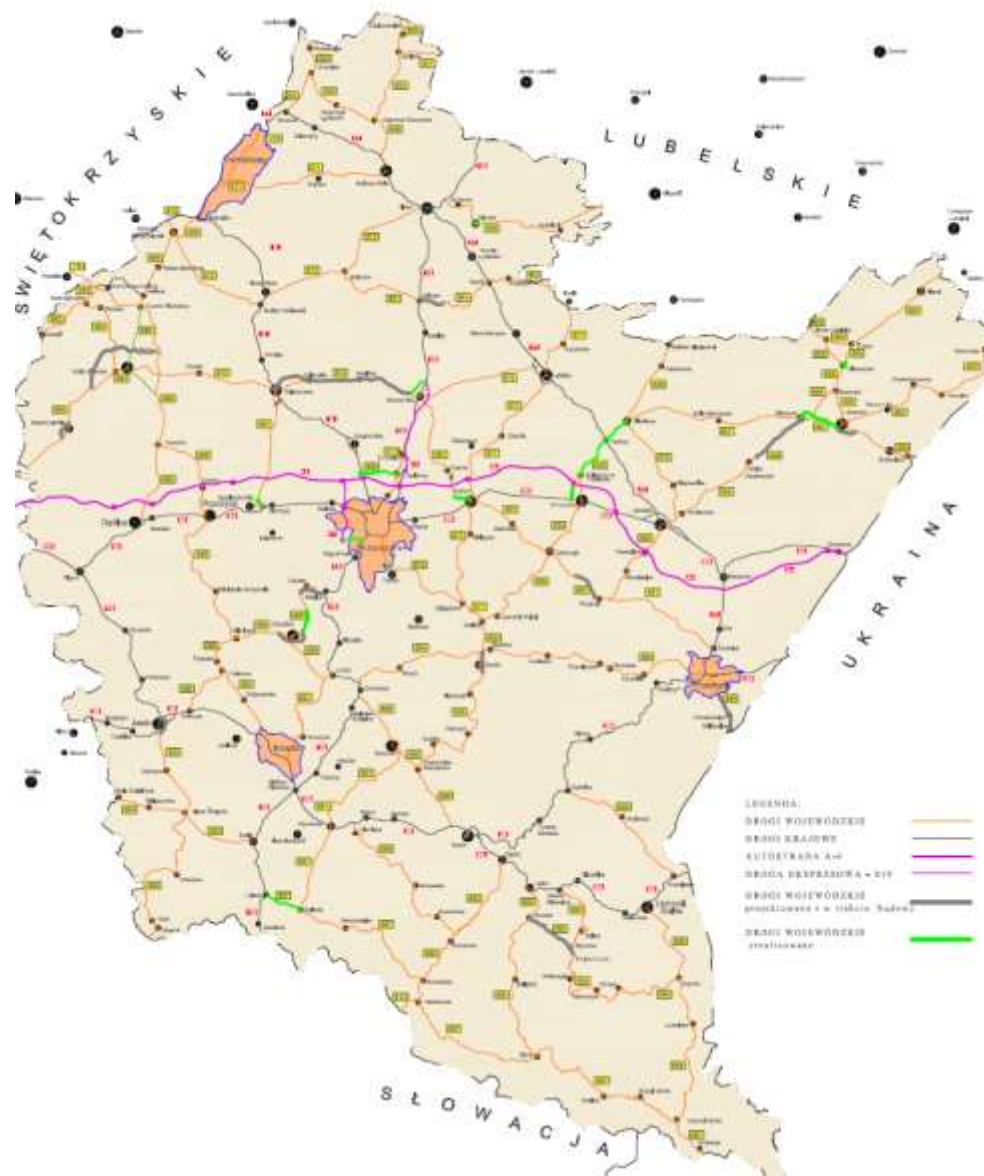



***Dziękuję za uwagę***
